


Ejecución física de los proyectos de inversión

AL 30 DE JUNIO DE 2026



Menos proyectos, más retrasos y mayores costos en inversiones públicas.


Al 2T2026, el 40% de los proyectos tienen un retraso promedio de más dos años y medio, incrementándose en 29% respecto al 2T2025.

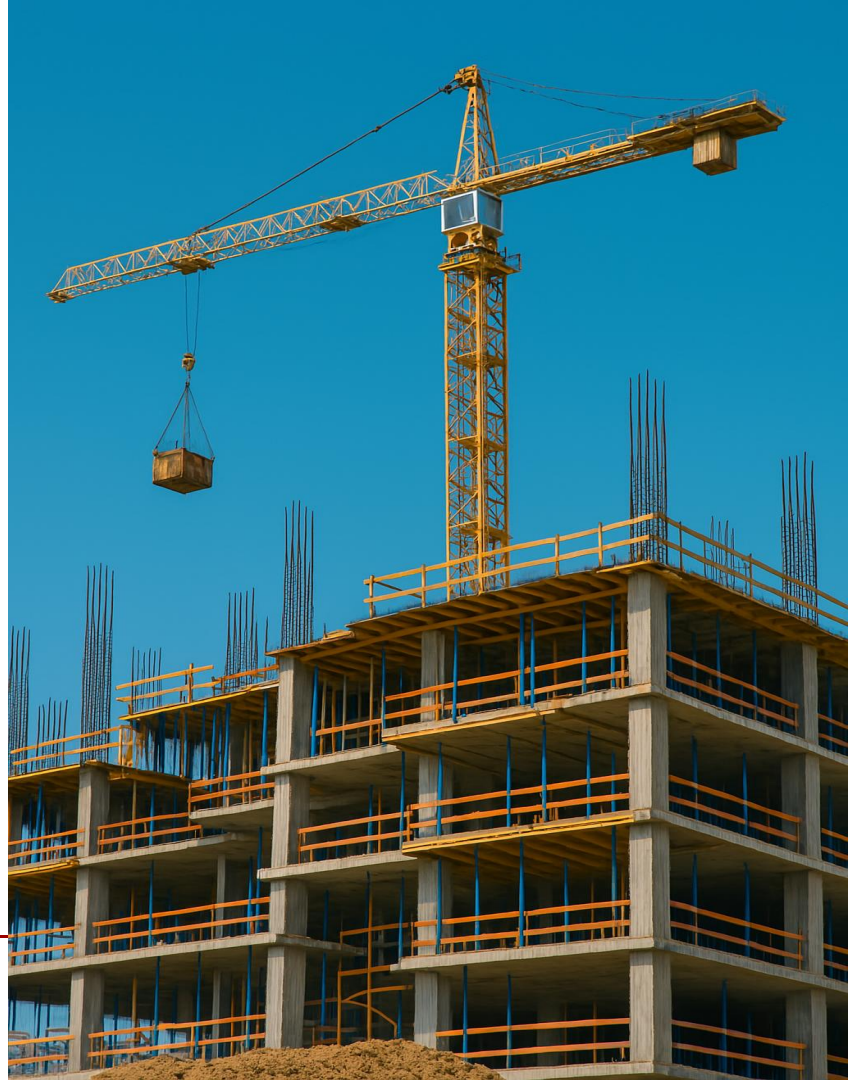

PROYECTOS ACTIVOS CON PIM

Al 2T2026 hubo **41.528 inversiones activas con PIM** registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Esto representa una reducción de **-6,7%** respecto al 2T2025 (44.514 proyectos). Los gobiernos locales concentraron el **84%** del total de proyectos.

Proyectos activos con PIM, por nivel de gobierno

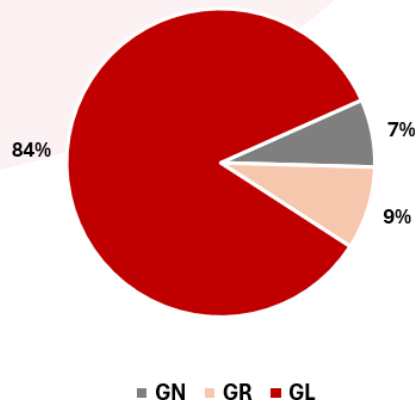

Nivel de gobierno	# de proyectos
Gobierno Nacional (GN)	2.952
Gobierno Regional (GR)	3.604
Gobierno Local (GL)	34.972
Total	41.528

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para monitorear el avance físico del proyecto se utilizan los indicadores de **incumplimiento, variación del costo y retraso**.

Indicador	Descripción
Retraso (días) ^{1/}	Días de retraso que tiene el proyecto a la fecha (fecha de corte - fecha fin ejecución)
Variación del costo (%) ^{2/}	Variación porcentual del costo actualizado respecto al costo en el expediente técnico.
Incumplimiento (%) ^{3/}	Proyectos sobre los cuales sobre los cuales no se informa el avance físico sobre el total de proyectos con devengado acumulado

1/ Solo se consideran a los proyectos con días de retraso mayor a cero.


2/ Solo se consideran los proyectos cuya variación de costo respecto al monto del primer expediente técnico y que no correspondan a proyectos IOARR.

3/ Todas las inversiones requieren informar salvo aquellas que sean FUR, IOARR de emergencia, no hayan devengado recursos a la fecha o hayan devengado y no cuenten con ET aprobado (Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

Retraso (días)

Al 2T2026, hubo **16.086** proyectos con retraso en su finalización, alcanzando un retraso promedio de **864 días mayor** al retraso promedio en el 2T2025 (**671**). A nivel de gobierno, el **GN** tuvo el **mayor** retraso promedio (**1.055 días**), **por encima** de los 836 días observados en el 2T2025.

Retraso (días) al 2T2026, por nivel de gobierno

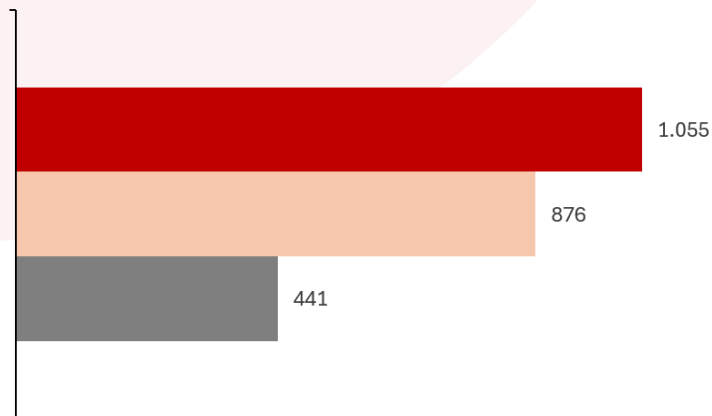

■ GN ■ GR ■ GL


FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

Nivel de gobierno	# Proyectos con retraso	# Proyectos con retraso mayor a 365 días
GN	1.296	763
GR	1.127	422
GL	13.663	4.764
Total	16.086	5.949

Variación del costo (%)

Al 2T2026, hubo **10.179 proyectos** con variación de costo respecto al monto del expediente técnico, alcanzando una variación promedio de **62% mayor** al alcanzado en el 2T2025 (**46%**). A nivel de gobierno, los **GR** tuvo la **mayor** variación respecto al expediente (**84%**) , **por encima** del 68% registrado en el 2T2025.

Variación del costo (%) al 2T2026, por nivel de gobierno

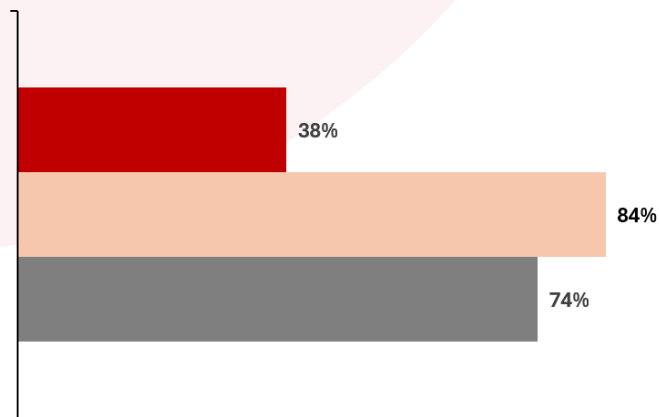

■ GN ■ GR ■ GL


Nivel de gobierno	# Proyectos con var. costo	# Proyectos con var. costo mayor a 50%
GN	1.083	272
GR	1.237	395
GL	7.859	1.629
Total	10.179	2.296

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

Incumplimiento de registro de información (%)

Al 2T2026, hubo **41.528** proyectos activos con PIM. De este total, **28.720** debieron informar sobre el avance físico de la obra; sin embargo, el **33%** (**9.564**) no cumplió esta exigencia y esta cifra es **menor** del registrado al 2T2025 (**42%**). A nivel de gobierno, los **GL** tuvieron el mayor nivel de incumplimiento (**36%**) , **por debajo** del 46% en el 2T2025.

Nivel de incumplimiento (%) de información de avance físico al 2T2026

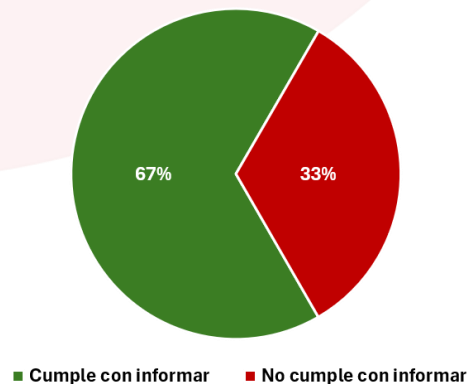

Nivel de incumplimiento (%) de información de avance físico, por nivel de gobierno, 2T2026

Nivel de gobierno	Incumplimiento (%)
GN	16%
GR	25%
GL	36%

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO NACIONAL

En el GN, los cinco sectores con mayor número de proyectos activos con PIM (Educación, Vivienda, Transporte, Agricultura e Interior) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del **17%**. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de **37%** y un retraso de **892 días**.

Sector	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
Educación	824	8%	54%	630
Vivienda	501	19%	31%	869
Transporte	430	35%	40%	1.263
Agricultura	341	16%	28%	743
Interior	157	7%	32%	953
Total	2.253	17%	37%	892

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO REGIONAL

Departamento ejecutora	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
Puno	292	23%	73%	469
La Libertad	272	33%	44%	514
Cajamarca	241	24%	105%	216
Junín	219	29%	61%	380
Loreto	197	23%	62%	373
Total	1.221	27%	69%	391

En el GR, los cinco departamentos con mayor número de proyectos activos con PIM (Puno, La Libertad, Cajamarca, Junín y Loreto) tienen en promedio, un incumplimiento de registro de información del **27%**. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de **69%** y un retraso de **391 días**.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO LOCAL

En el GL, las cinco municipalidades con mayor número de proyectos activos con PIM (San Marcos, Vista Alegre, Nuevo Chimbote, Marcona e Independencia) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del **30%**. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de **49%** y un retraso de **576 días**.

Municipalidad	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	702	28%	24%	774
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	251	11%	22%	629
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	200	31%	12%	324
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA	196	52%	150%	752
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	190	26%	35%	400
Total	1,539	30%	49%	576

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

#CPC Informa: Ejecución física de los proyectos de inversión

Escanea el QR para revisar
el tablero de Seguimiento
de ejecución física

