

INVERSIÓN PÚBLICA

AL 31 DE MAYO DE 2025




Estancamiento y fragmentación en la inversión pública: uno de cada dos proyectos no se ejecuta y se incorporaron más de 16 mil nuevos entre enero y mayo (+170%).



PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA 2025,
SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{1/}


El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversión es de **S/64.954 millones** y se distribuye de la siguiente manera: el gobierno nacional (GN) concentra el **38% (S/ 24.747 millones)**; los gobiernos locales (GL), el **38% (S/24.895 millones)** y los gobiernos regionales (GR), el **24% (S/ 15.312 millones)**. A mayo de 2025, se ha ejecutado el 30% del PIM.

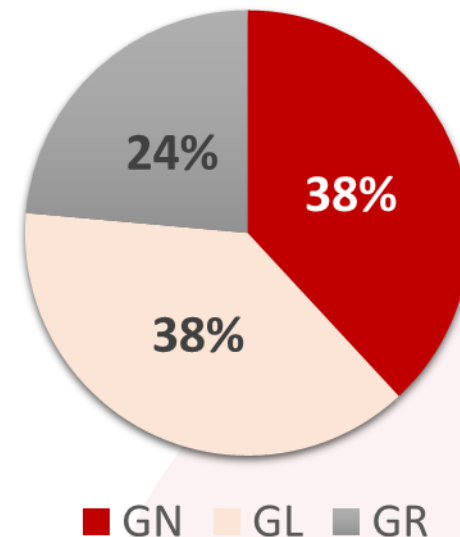

^{1/} El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA A MAYO DE CADA AÑO,
2020-2025 (S/ MILLONES)^{1/}

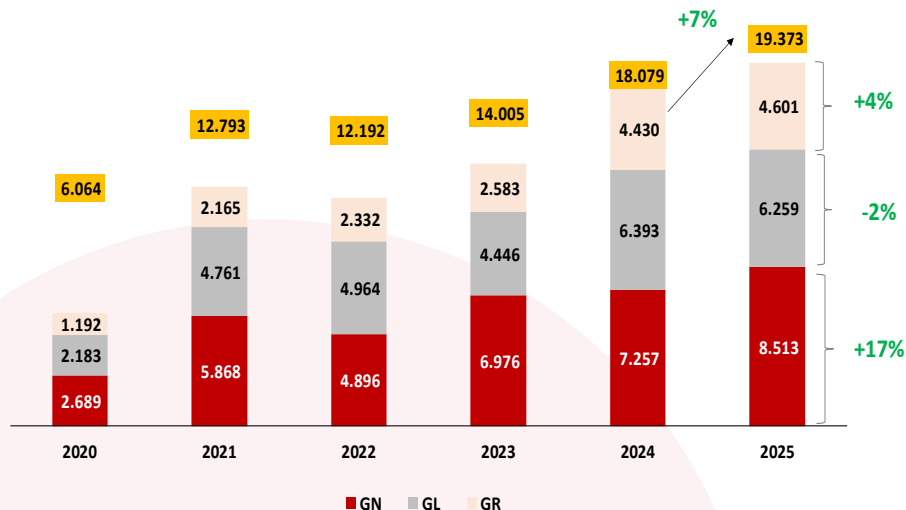

^{1/} La ejecución de la inversión pública corresponde al presupuesto devengado.


FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

A mayo de 2025 la inversión pública ascendió a **S/ 19,4 mil millones**, incrementándose en **+7%** con relación al mismo mes de 2024. No obstante, el crecimiento se ha desacelerado de forma sostenida en los últimos meses: fue de +13% en abril y +18% en marzo.

En detalle, el GN ejecutó **S/8,5 mil millones (+17% interanual)**; los GL, **S/6,3 mil millones (-2%)**; y los GR, **S/ 4,6 mil millones (+4%)**.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

EJECUCIÓN MAYO 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)

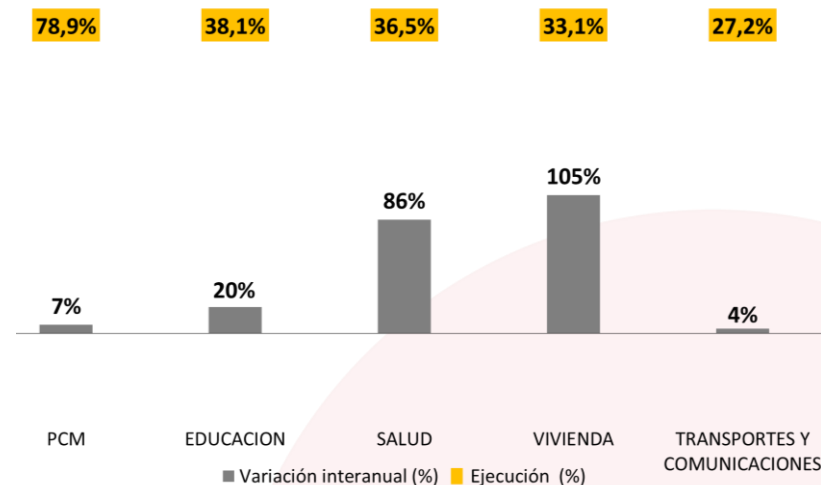

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

En el GN **los cinco sectores con mayor PIM** (Transportes, Educación, PCM, Salud y Vivienda) tienen en conjunto **S/ 18.470 millones** de presupuesto (de un total de S/ 24.747 millones) y han ejecutado **S/ 7.338 millones (39,7%)**. En este grupo el **sector Transportes**, que cuenta con un PIM de **S/ 7.856 millones**, tiene la menor ejecución (**27,2%**) y la menor variación interanual de **4%**.


En contraste, se observa que la PCM, con un PIM de **S/ 3.107 millones**, es la que tiene mayor porcentaje de ejecución (**78,9%**) y una variación interanual de **7%**, impulsada por la ejecución de la Autoridad Nacional de Infraestructura (**S/ 2.427 millones** de ejecución que representa el **82,8%** de su presupuesto).



EJECUCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

A nivel de GL, **los cinco GL con mayor presupuesto** (Lima, San Marcos, Megantoni, Marcona y Yarabamba) tienen en conjunto **S/ 3.120 millones** (de un total de S/24.895 millones) y han ejecutado **S/ 1.141 millones (36,6%)**. En este grupo, se observa que Marcona, que cuenta con un PIM de **S/ 265 millones**, tiene la menor ejecución (**11,4%**) y una variación interanual de **-6%**.

EJECUCIÓN MAYO 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)

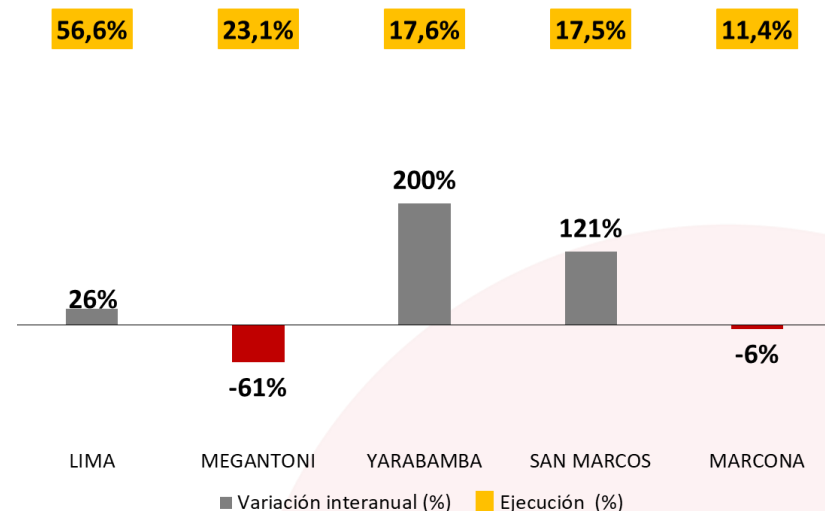


FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

En contraste, la municipalidad de Lima, que cuenta con **S/ 1.513 millones** de PIM, es la que tiene el mayor porcentaje de ejecución (**56,6%**) y una variación interanual de **+26%**.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

A nivel de **GR**, los cinco GR con mayor presupuesto (Piura, Loreto, La Libertad, Cusco y Cajamarca) tienen en conjunto **S/5.315 millones** (de un total de S/ 15.312 millones) y han ejecutado **S/ 1.468 millones (27,6%)**. En este grupo, el **GR La Libertad**, que cuenta con un PIM de **S/ 976 millones**, tiene la menor ejecución(**18,4%**) y una variación interanual de **+14%**.

EJECUCIÓN MAYO 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)


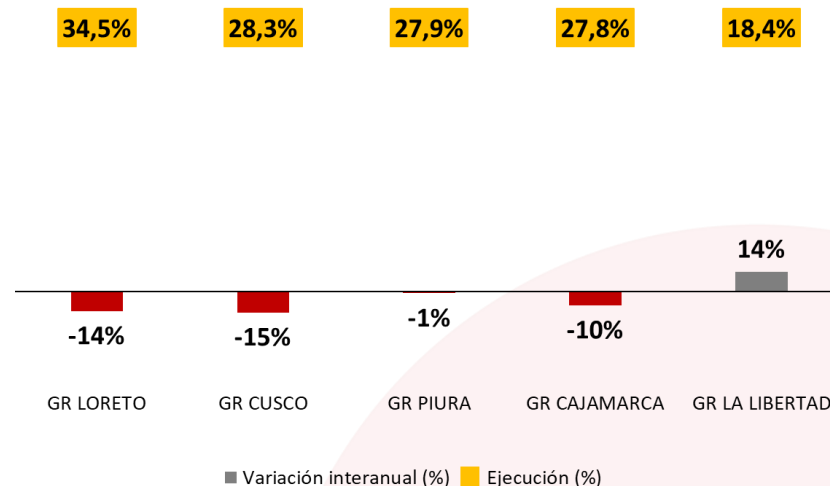


FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

En contraste, el GR Loreto, que cuenta con un PIM de **S/ 1.121 millones**, es el que tiene mayor porcentaje de ejecución (**34,5%**), pero una variación interanual de **-14%**.

ANÁLISIS DE CONTINUIDAD PRESUPUESTAL

A mayo de 2025, hay **49.434 proyectos** con PIM. De este total, **44.711** tienen una única unidad ejecutora y están registrados en el sistema Invierte.pe. Entre estos, el **63%** son proyectos continuados; es decir, que tuvieron presupuesto en 2024, siendo el gobierno nacional (GN) el que alcanza el mayor porcentaje de continuidad con **75%** (3.083 de 4.104).

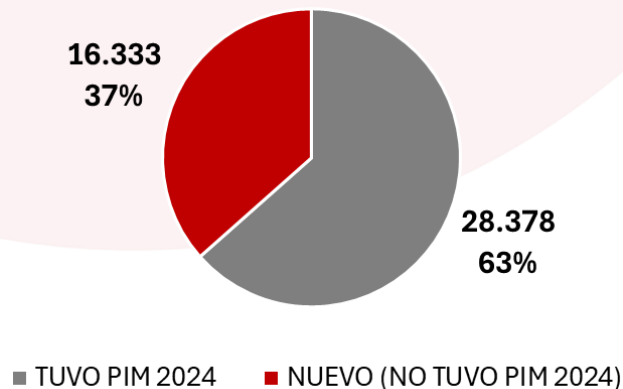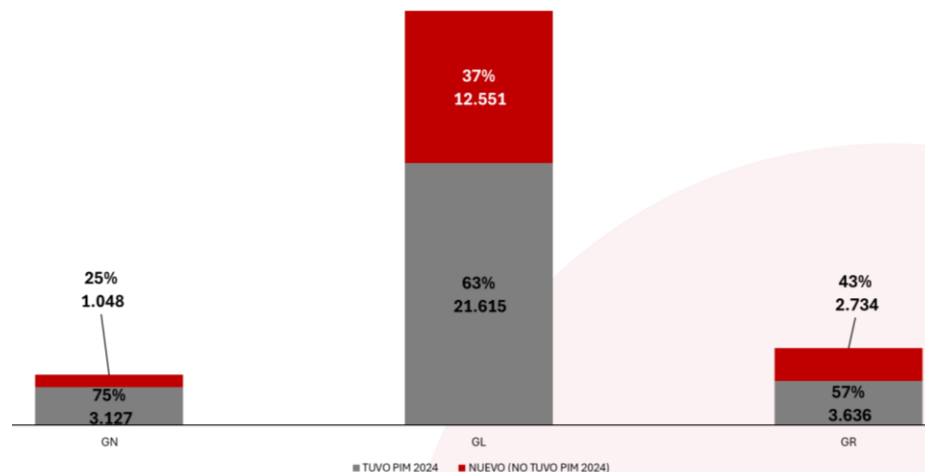Proyectos con PIM 2025^{1/}Proyectos con PIM 2025^{1/}, por nivel de gobierno

^{1/}No se considera el PIM de los proyectos no registrados en el Invierte (ej. Gestión de proyectos (CUI:2000270) ni los proyectos con más de una ejecutora).

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

En enero, habían **37.700** proyectos activos sin continuidad presupuestal, de los cuales **6.194** eran críticos (ejecución financiera entre 10% y 85%). A mayo, se han incorporado **2.348** de estos proyectos críticos, quedando un total de **3.846** sin continuidad.

Proyectos activos con PIM 2024 sin continuidad presupuestal a mayo 2025, por nivel de gobierno^{1/}

Rango de ejecución financiera a diciembre 2024	Sin continuidad presupuestal a enero 2025	Sin continuidad presupuestal a mayo 2025	Diferencia (Incorporados entre enero y mayo)
0-10%	16.431	11.245	5.186
10-30%	1.637	1.024	613
30-50%	1.056	611	445
50-85%	3.501	2.211	1.290
85% o más	15.108	11.934	3.174
Total	37.733	27.025	10.708

^{1/}Las filas resaltadas correspondan a los proyectos críticos

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

Por otro lado, a mayo el total de **proyectos nuevos incorporados (con PIM 2025, pero que no lo tuvieron en el 2024)** es de 16.333, lo que representa un incremento de **170%** respecto a enero.

Proyectos nuevos incorporados, por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Proyectos nuevos incorporados (con PIM 2025, pero no con PIM 2024)		
	Balance a enero 2025	Balance a mayo 2025	Variación (%)
GN	723	1.048	45%
GL	4.284	12.551	193%
GR	1.050	2.734	160%
Total	6.057	16.333	170%

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

PROYECTOS CON EJECUCIÓN CERO

A mayo de 2025, hay **24.027 proyectos con ejecución cero (49% del total)** y con un PIM acumulado de **S/13.723 millones (21% del total)**.

En el GN hay **1.731 proyectos con ejecución cero (40% de su total)** que suman un PIM de **S/ 2.785 millones (11% de su PIM total)**. Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 770 millones (28% del PIM de proyectos con ejecución cero)**. En este grupo, el sector de Transporte tiene cuatro proyectos con un PIM acumulado de **S/ 143 millones** (ver Tabla 1).

Tabla 1. GN: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Sectores	Proyecto	Presupuesto (\$/millones)	Ejecución	% Ejecución
INTERIOR	2379484-REPOSICION DE LA AERONAVE ANTONOV AN.32B PNP-234	253	0	0,0%
INTERIOR	2251056-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL	137	0	0,0%
SALUD	2430242-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD	75	0	0,0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2428087-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	64	0	0,0%
CULTURA	2233917-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - SEDE PUEBLO LIBRE; DISTRITO PUEBLO LIBRE; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	50	0	0,0%
SALUD	2539902-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS DE CHOTA; DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	47	0	0,0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2391564-REPARACION DE PISTA DE ATERRIZAJE; PLATAFORMA DE AERONAVES; CALLE DE RODAJE; MARGEN DE PISTA DE ATERRIZAJE; FRANJA DE PISTA DE ATERRIZAJE; SISTEMA DE DRENAJE Y CERCO; EN EL(LA) AERODROMO DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS; PROVINCIA ALTO AMAZONAS; DEPARTAMENTO LORETO	43	0	0,0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2557110-ADQUISICION DE ANTENA; MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO; EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y VEHICULO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIONES Y SANCIONES EN COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DISTRITO DE LIMA; PROVINCIA LIMA; DEPARTAMENTO LIMA	42	0	0,0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2397504-MEJORAMIENTO FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCABELICA CENTRO POBLADO DE CHILCA - DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN; CENTRO POBLADO DE HUANCABELICA - DISTRITO DE HUANCABELICA - PROVINCIA DE HUANCABELICA - REGION HUANCABELICA	31	0	0,0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2543359-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) - CHILLIA - EMP. PE-10 C (DV. HUAYLILLAS); EMP. PE-10 C (HUAYLILLAS) - EMP. PE-12 B (DV. UCHOS); EMP. PE-10 C (DV. TAYABAMBA) - QUEROS - COLLAY - TOMAC; EMP. PE-10 C (CHILCABAMBA) - CHAQUICOCHA - HUARIMARCA - ALBORADA DE LOS ANDES; POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE PARCOY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	28	0	0,0%
		770	0	0%

Tabla 2. GL: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Departamento	Gobierno local	Proyecto	Presupuesto (S/millones)	Ejecución	Ejecución (%)
LIMA	LIMA	2589320-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS; TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	77	0	0,0%
PASCO	OXAPAMPA	2309153-INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA; PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	57	0	0,0%
ICA	MARCONA	2587333-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE MARCONA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	53	0	0,0%
CAJAMARCA	PEDRO GALVEZ	2451149-MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (IHCOCAN) - DV. LLAÑUPACHA - DV. CHIQUIPUQUIO - DV. PAMPLONA - DV. PAUCA - DV. CHUCO - SHIRAC - LIC LIC - DV. ALIZOPATA - JOSE SABOGAL (VENEZIA) - TINYAYOC - MALAT; EMP. CA-1566 - SAN ISIDRO; DV. SHIRAC - SHIRAC - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	49	0	0,0%
AREQUIPA	YARABAMBA	2001445-CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	41	0	0,0%
PIURA	AYABACA	2427250-MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE AYABACA; DISTRITO DE AYABACA; PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	32	0	0,0%
LIMA	LIMA	2688563-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO TRAMO AV. UNIVERSITARIA - LIMITE PROVINCIAL DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	31	0	0,0%
CAJAMARCA	PULAN	2433102-MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TOSTEN - NOGAL; PAN DE AZUCAR - PAN DE AZUCAR BAJO; EL ROBLE - GUAYAQUIL; TILLAPAMPA- CHILINLLA Y LA PAUCA - EL PROVENIR; LA PALOMITA- CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	28	0	0,0%
ANCASH	SAN MARCOS	2344302-CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL; HUARIPAMPA ALTO; HUARIPAMPA BAJO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	28	0	0,0%
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	2307972-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO VILCASHUAMAN; DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	28	0	0,0%
			425	0	0%

En los GL hay **19.391 proyectos con ejecución cero** (51% de su total) que suman un PIM de **S/ 8.302 millones** (33% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 425 millones** (5% del PIM de proyectos con ejecución cero). En este grupo, la municipalidad de Lima tiene dos proyectos con un PIM acumulado de **S/ 108 millones** (ver Tabla 2).

Tabla 3. GR: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Gobierno regional	Proyecto	Presupuesto (\$/millones)	Ejecución	% Ejecución
GOB.REG. DE LORETO	2526257-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS EN EL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	98	0	0,0%
GOB.REG. DE HUANCANECA	2326667-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY; PROVINCIA DE ANGAES; DEPARTAMENTO DE HUANCANECA	35	0	0,0%
GOB.REG. DE ICA	2456534-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TANGUIS DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	27	0	0,0%
GOB.REG. DE CAJAMARCA	2112981-MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	27	0	0,0%
GOB.REG. DE AMAZONAS	2608274-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS - SANTO TOMAS - SAN SALVADOR - SAN BARTOLOME - LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26	0	0,0%
GOB.REG. DE PIURA	2515777-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL TG8-4 ALTO; MEDIO Y ALTO; VALLE DE SAN LORENZO; EN LOS DISTRITOS DE TAMBO GRANDE Y LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	25	0	0,0%
GOB.REG. DEL CALLAO	2510453-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	24	0	0,0%
GOB.REG. DE PIURA	2310221-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO ARAMBULO SANTIN DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE; DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	22	0	0,0%
GOB.REG. DE LORETO	2489058-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA ABELARDO QUIÑONES EN LOS DISTRITOS DE BELEN Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	22	0	0,0%
GOB.REG. DE PIURA	2412474-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO - CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	19	0	0,0%
		325	0	0%

En los GR hay **2.903 proyectos con ejecución cero** (43% de su total) que suman un PIM de **S/ 2.635 millones** (17% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 325 millones** (12% del PIM de proyectos con ejecución cero). En este grupo, el GR Piura tiene tres proyectos con un PIM acumulado de **S/ 66 millones** (ver Tabla 3).

RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS



**Proyectos críticos sin
continuidad presupuestal**



3.846 proyectos



Proyectos nuevos incorporados



**16.333 proyectos
(36% del total)**



Proyectos con ejecución cero



**24.027 proyectos
(49% del total)**

**Los resultados muestran una fragmentación en la gestión de los
proyectos de inversión pública, lo que compromete el cierre de brechas.**

#CPC Informa: Inversión pública

Escanea el QR para ver
reportes de meses previos
o años anteriores

