


Ejecución física de los proyectos de inversión

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025



Proyectos con PIM acumulan importantes retrasos y variaciones en costos en inversiones públicas.


A octubre 2025, se registraron **52.342** proyectos activos con PIM. Sin embargo, las variaciones del costo ascienden a **121%** y los retrasos a **712 días**.

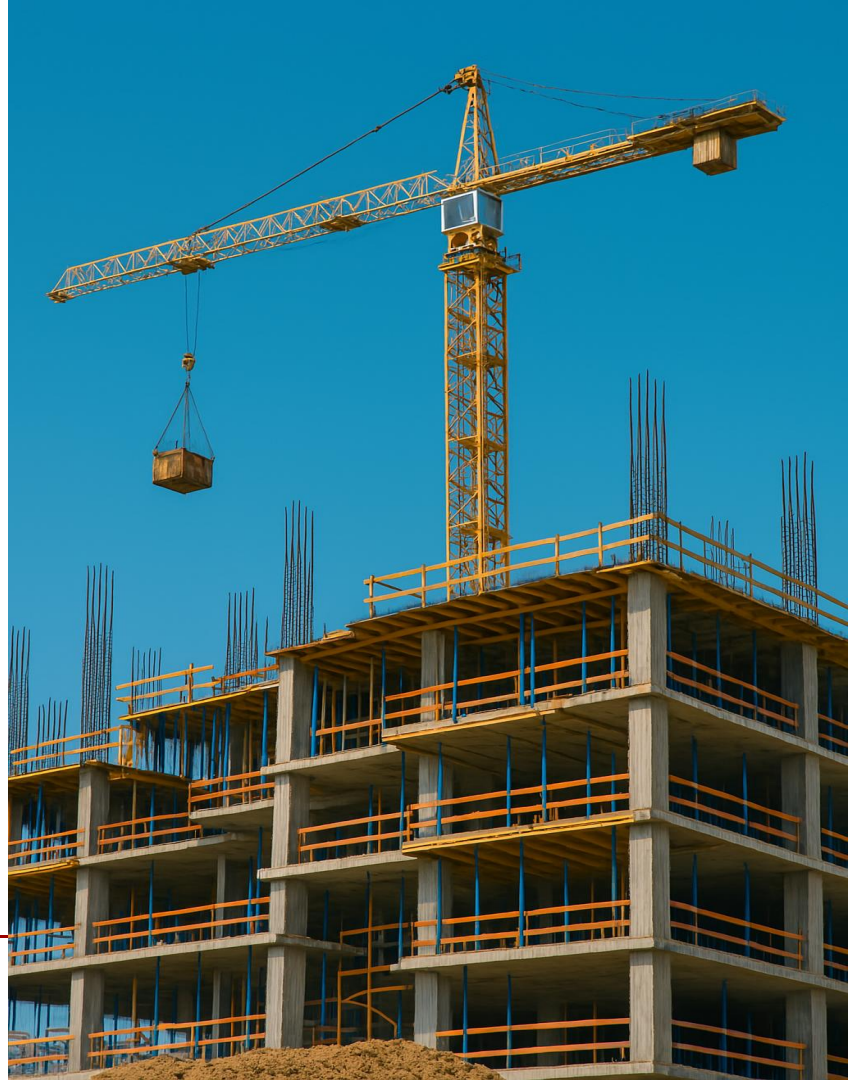

PROYECTOS ACTIVOS CON PIM

A octubre 2025 hubo **52.342 inversiones activas con PIM** registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Los gobiernos locales concentraron el **83%** del total de proyectos.

Proyectos activos con PIM, por nivel de gobierno

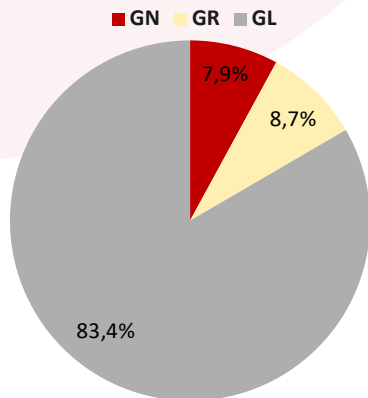

Nivel de gobierno	# Proyectos
Gobierno Nacional (GN)	4.156
Gobierno Regional (GR)	4.539
Gobierno Local (GL)	43.647
Total	52.342

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para monitorear el avance físico del proyecto se utilizan los indicadores de **incumplimiento, variación del costo y retraso**.

Indicador	Descripción
Incumplimiento (%) ^{1/}	Proyectos sobre los cuales sobre los cuales no se informa el avance físico sobre el total de proyectos con devengado acumulado
Variación del costo (%) ^{2/}	Variación porcentual del costo actualizado respecto al costo viable.
Retraso (días) ^{3/}	Días de retraso que tiene el proyecto a la fecha (fecha de corte - fecha fin programada)

1/ Todas las inversiones requieren informar salvo aquellas que sean FUR, IOARR de emergencia, no hayan devengado recursos a la fecha o hayan devengado y no cuenten con ET aprobado (Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

2/ Solo se consideran los proyectos cuya variación de costo respecto a la viabilidad sea superior al 30% y que no correspondan a proyectos IOARR.


3/ Solo se consideran a los proyectos con días de retraso mayor a cero.

Incumplimiento de registro de información (%)

A octubre 2025, hubo **52.342** proyectos activos con PIM. De este total, **34.202** debieron informar sobre el avance físico de la obra; sin embargo, el **41%** (**14.032**) no cumplió esta exigencia. A nivel de gobierno, los **GL** tuvieron el mayor nivel de incumplimiento (**44%**).

Nivel de incumplimiento (%) de información de avance físico a octubre 2025

■ Cumple con informar ■ No cumple con informar

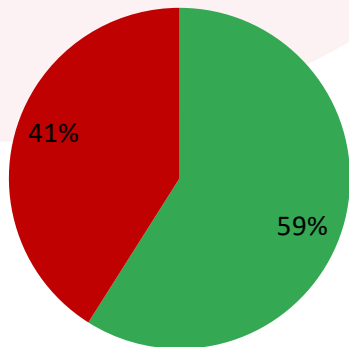

Nivel de incumplimiento, por nivel de gobierno, octubre 2025


Nivel de gobierno	Incumplimiento (%)
GN	24%
GR	27%
GL	44%

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

Variación del costo (%)

A octubre 2025, hubo **14.309 proyectos** con variación de costo respecto al monto viable, alcanzando una variación promedio de **121%**. A nivel de gobierno, el **GN** tuvo la mayor variación respecto a la viabilidad (**125%**).

Variación del costo (%) a octubre 2025, por nivel de gobierno

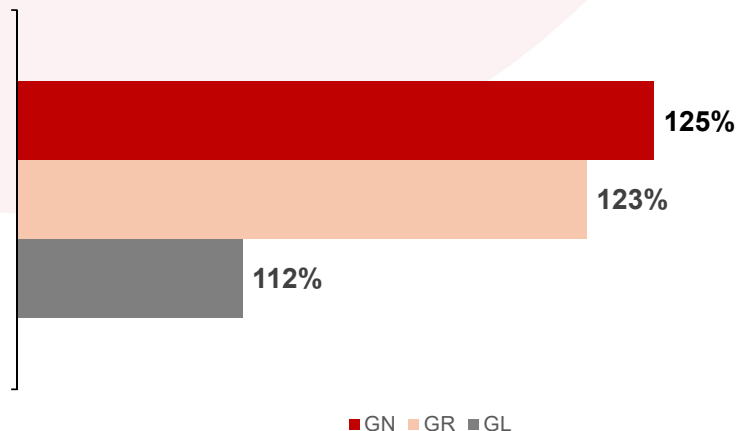


Nivel de gobierno	# Proyectos con var. costo	# Proyectos con var. costo mayor a 50%
GN	1.649	1.379
GR	1.705	1.435
GL	10.955	8.088
Total	14.309	10.902

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

Retraso (días)

A octubre 2025, hubo 12.619 proyectos con retraso en su finalización, alcanzando un retraso promedio de 712 días. A nivel de gobierno, el GN tuvo el mayor retraso promedio (901 días).

Retraso (días) a octubre 2025, por nivel de gobierno

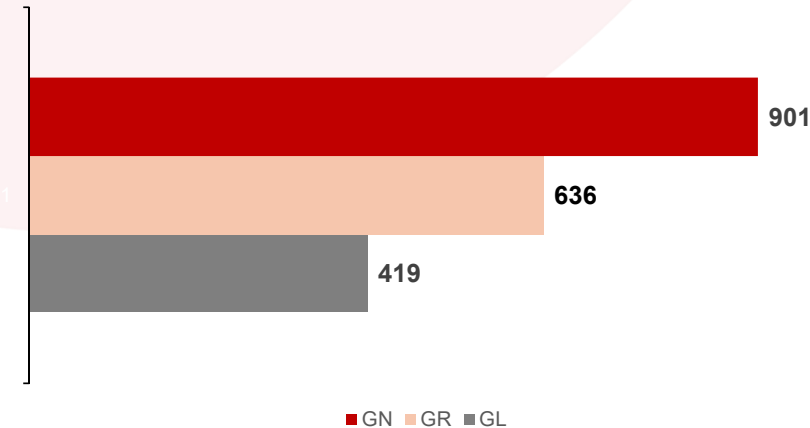

Nivel de gobierno	# Proyectos con retraso	# Proyectos con retraso mayor a 100 días
GN	973	666
GR	572	384
GL	11.074	7.269
Total	12.619	8.319

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO NACIONAL

En el GN, los cinco sectores con mayor número de proyectos activos con PIM (Educación, Agricultura, Vivienda, Transporte e Interior) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del **26%**. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de **118%** y un retraso de **1.014 días**.

Sector	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
Educacion	1.138	15%	138%	624
Agricultura	583	34%	159%	709
Vivienda	560	32%	115%	436
Transportes	489	36%	109%	1.233
Interior	180	18%	132%	161
Total	2.950	26%	118%	1.014

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO REGIONAL

Departamento ejecutora	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
Lima	334	38%	128%	372
Cajamarca	313	26%	132%	205
La Libertad	280	24%	110%	385
Junin	263	33%	131%	548
Puno	257	29%	105%	876
Total	1.447	31%	120%	412

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

En el GR, los cinco departamentos con mayor número de proyectos activos con PIM (Lima , Cajamarca, La Libertad, Junín y Puno) tienen en promedio, un incumplimiento de registro de información del **31%**. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de **120%** y un retraso de **412 días**.

GOBIERNO LOCAL

En el GL, los cinco distritos con mayor número de proyectos activos con PIM (San Marcos, Lima, Vista Alegre, Chavín de Huántar y Cerro Colorado) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del **29%**. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de **91%** y un retraso de **577 días**.

Distrito ejecutora	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
San Marcos	797	22%	115%	379
Lima	269	34%	79%	756
Vista Alegre	243	32%	100%	235
Chavin De Huantar	235	54%	74%	366
Cerro Colorado	223	22%	78%	718
Total	1.767	29%	91%	577

FUENTE: DATA PARA LA ACCIÓN. ELABORACIÓN: CPC

#CPC Informa: Ejecución física de los proyectos de inversión

Escanea el QR para revisar
el tablero de Seguimiento
de ejecución física

