


Ejecución física de los proyectos de inversión

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026



Ejecución física de proyectos al 3T2026:


Al 3T2026, cerca de **3 de cada 10 proyectos con presupuesto** registran retrasos respecto de su fecha prevista de culminación física, con un retraso promedio de **más de dos años**.

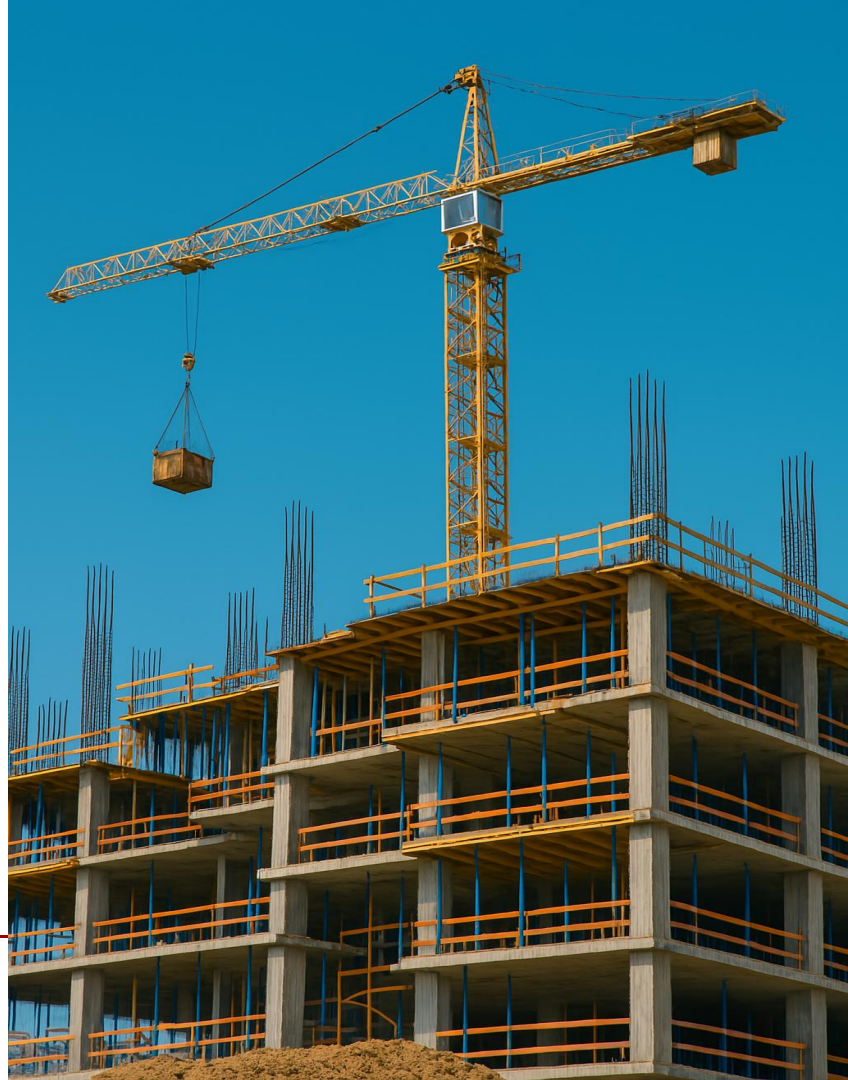

PROYECTOS ACTIVOS CON PIM

Al 3T2026 hubo **46.468 inversiones activas con PIM** registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Esto representa una reducción de **8,6%** respecto al 3T2025 (50.813 proyectos). Los gobiernos locales concentraron el **85%** del total de proyectos.

Proyectos activos con PIM, por nivel de gobierno

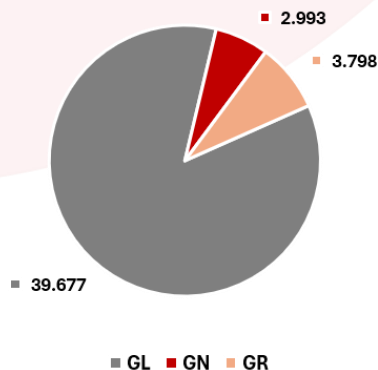

Nivel de gobierno	# Proyectos activos con PIM
Gobierno Nacional (GN)	2.993
Gobierno Regional (GR)	3.798
Gobierno Local (GL)	39.677
Total	46.468

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Para monitorear el avance físico del proyecto se utilizan los indicadores de **incumplimiento, variación del costo y retraso**.

Indicador	Descripción
Retraso (días) ^{1/}	Días de retraso que tiene el proyecto a la fecha (fecha de corte - fecha fin ejecución física)
Variación del costo (%) ^{2/}	Variación porcentual del costo actualizado respecto del costo del primer expediente técnico aprobado.
Incumplimiento (%) ^{3/}	Porcentaje de inversiones obligadas a reportar su avance físico que no cumplen con dicho registro.

1/ Solo se consideran a los proyectos con días de retraso mayor a cero. El indicador es un promedio ponderado por el costo actualizado del proyecto.


2/ Se consideran proyectos con variación positiva del costo respecto del primer expediente técnico aprobado, excluyendo las IOARR. El indicador corresponde a un promedio ponderado por el costo actualizado de cada proyecto.

3/ Todas las inversiones requieren informar salvo aquellas que sean FUR, IOARR de emergencia, no hayan devengado recursos a la fecha o hayan devengado y no cuenten con ET aprobado (Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

Retraso (días)

Al 3T2026, **12.963** (28% del total) proyectos registraron retrasos respecto de la fecha prevista de culminación física, con un retraso promedio de **845 días superior** a los **698 días** del 3T2025. Por nivel de gobierno, el **GN** presentó el **mayor** retraso promedio (**1.167 días**), **por encima** de los 881 días registrados en el 3T2025.

Retraso (días) al 3T2026, por nivel de gobierno

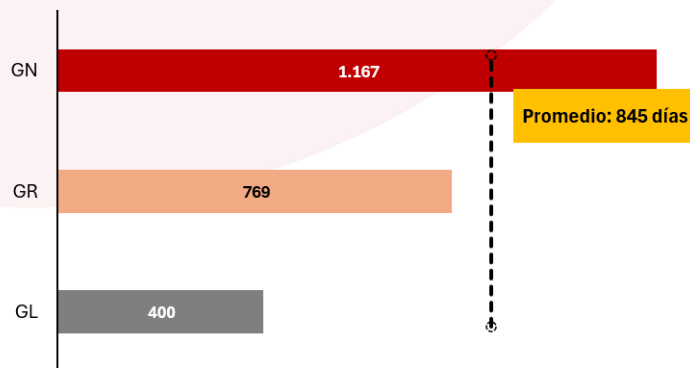


Nivel de gobierno	# Proyectos con retraso	# Proyectos con retraso mayor a 365 días
GN	1.079	650
GR	914	241
GL	10.970	3.072
Total	12.963	3.963

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

Variación del costo (%)

Al 3T2026, hubo **11.749 proyectos** (25% del total) con variación de costo respecto al monto del expediente técnico, alcanzando una variación promedio del **62% superior** al **47%** alcanzado en el 3T2025. Por nivel de gobierno, los **GR** presentaron la **mayor** variación respecto al expediente (**81%**) **por encima** del 67% registrado en el 3T2025.

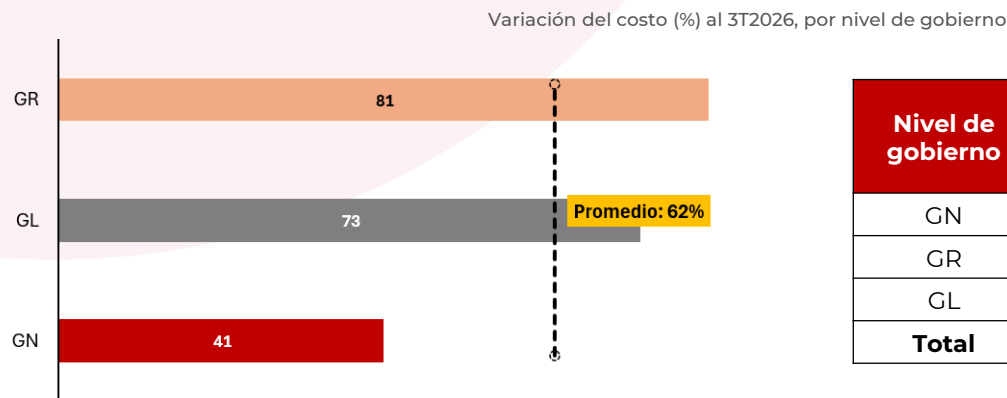


Nivel de gobierno	# Proyectos con var. costo	# Proyectos con var. Costo mayor a 50%
GN	1.097	288
GR	1.298	423
GL	9.354	1.841
Total	11.749	2.552

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

Incumplimiento de registro de información (%)

Al 3T2026, de las **46.468** inversiones activas con PIM, **34.067** estaban obligadas a reportar su avance físico. Sin embargo, el **31% (10.699)** incumplió esta obligación, lo que representa una reducción de 10 puntos porcentuales respecto del 3T2025 (**41%**). Por nivel de gobierno, los **GL** tuvieron el mayor nivel de incumplimiento (**33%**) , **por debajo** del 44% en el 3T2025.

Nivel de incumplimiento (%) de información de avance físico al 3T2026

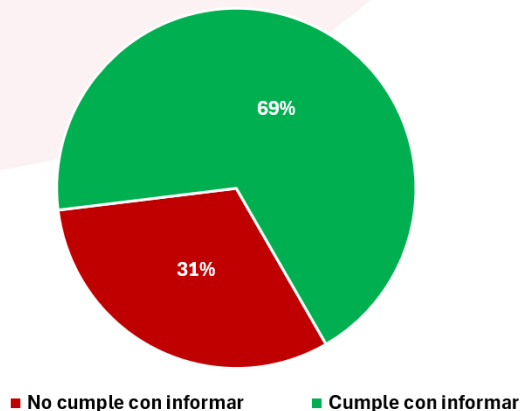

Nivel de incumplimiento (%) de información de avance físico, por nivel de gobierno, 3T2026

Nivel de gobierno	Incumplimiento (%)
GN	16%
GR	24%
GL	33%

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO NACIONAL

En el GN, los cinco sectores con mayor número de proyectos activos con PIM (Educación, Vivienda, Transporte, Agricultura e Interior) registraron, en promedio, un incumplimiento de registro de información del **16%**. Asimismo, alcanzan una variación promedio del costo de **41%** y un retraso promedio de **1.030 días**.

Sector	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
EDUCACION	851	11%	52%	724
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	496	17%	38%	1.023
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	416	32%	40%	1.547
AGRICULTURA Y RIEGO	339	12%	40%	824
INTERIOR	164	7%	34%	1.030
Total	2.266	16%	41%	1.030

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO REGIONAL

Gobierno Regional	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
PUNO	302	22%	74%	381
LA LIBERTAD	266	34%	49%	573
CAJAMARCA	265	25%	105%	229
JUNIN	255	32%	57%	239
CUSCO	216	14%	98%	103
Total	1.304	25%	77%	305

En los GR, los cinco departamentos con mayor número de inversiones activas con PIM (Puno, La Libertad, Cajamarca, Junín y Cusco) registraron, en promedio, un incumplimiento de registro de información del **25%**. Asimismo, alcanzan una variación promedio del costo de **77%** y un retraso promedio de **305 días**.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

GOBIERNO LOCAL

En el GL, las cinco municipalidades con mayor número de proyectos activos con PIM (San Marcos, Cerro Colorado, Vista Alegre, Nuevo Chimbote e Independencia) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del **27%**. Asimismo, alcanzan una variación promedio del costo de **27%** y un retraso promedio de **419 días**.

Municipalidad	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
SAN MARCOS	951	19%	20%	653
CERRO COLORADO	263	38%	24%	445
VISTA ALEGRE	236	17%	30%	428
NUEVO CHIMBOTE	226	30%	11%	331
INDEPENDENCIA	215	31%	53%	238
Total	1.891	27%	27%	419

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

#CPC Informa: Ejecución física de los proyectos de inversión

Escanea el QR para revisar
el tablero de Seguimiento
de ejecución física

